Survey Chan. Bk. 5-19
Plan D.L.
Exc D.L.
Checked J.F.

B.M. 98.32 "G" IN GLOBE 3. END CO. N.E. COR. MINNEAPOLIS & HODSON

CHAINING E. ON & HODSON

0+55' Brg. Water Fence 37' Rt.
0+80 8" Locust Tree 36' Rt.

0+77 7" Locus Tree 38' Rt.

1+26 8" Locus Tree 30' Rt.
1+29 Brg. Picnic Bed 12.8' Rt.


1+45 End Fence 37' Rt.
1+45 End Flower Bed 18' Rt.

1+93 & 22 Conc. Dr. 18.5' Rt.

2+48' & 22' Conc. Dr. 32.8' Rt.

E. IC

Fill	Cut
237.6	18.6
+16%	+2%
261.4 cu. yds.	20.5 cu. yds.

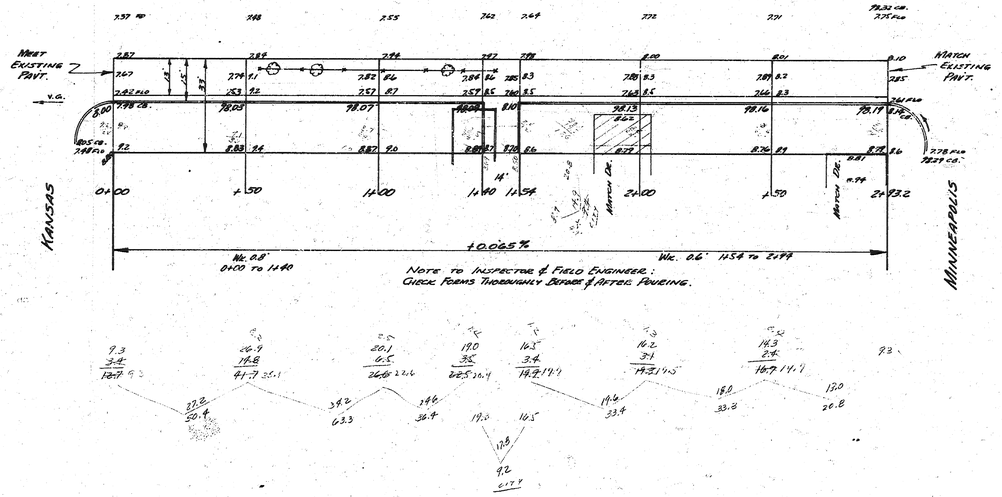

B. E. SMITH ENGINEER 436 KANSAS PROFESSIONAL ENGINEER

S½ HODSON
E.L. KANSAS TO W.L. MINNEAPOLIS
13-2-15 A.C.
CITY OF WICHITA, KANSAS
B.E. SMITH · CITY ENGINEER
AUGUST, 1953 PROJ. C13-113

Sheet 5 of 10
